

Dispozitie de santier Nr. 001/14.04.2025 SANTIER SATU NOU DE JOS

Obiectiv investitie: „Extindere retea de canalizare menajera in Satu nou de jos, comuna Grosi, judetul Maramures”
Cod Proiect: XT211/2024
Amplasament: comuna Grosi, jud. Maramures
Beneficiar: Comuna Grosi
Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Executant: SC ALAVAL PROD COM S.R.L.

Informatii care fondeaza emiterea dispozitiei

Prezenta dispozitie de santier se emite in urma solicitarii beneficiarului, in stransa legatura cu indicatiile executantului si a dirigintelui de santier, materializat prin notele de constatare nr. 1 din 21.03.2025 respectiv nr.2 din 04.04.2025 cu scopul de a corela, optimiza situatiile aparute in perioada de executie a lucrarilor.

DISPUNEM:

- Se vor putea executa racorduri si direct in colectorul de canalizare cu respectarea legislatiei in vigoare, in acest sens se emite delatiu suplimentar, plansa D-14- Detaliu racordare in colector cu ramnificatie tip Y. Pozitiile in plan si solutiile de racord, in caminul de vizitare sau in direct in colector vor fi stabilite de catre executant in functie de pozitiile punctelor de racord la proprietati respectiv a retelei de canalizare.
- Reteaua de canalizare de pe strada Garoafei se va executa conform plansei PS-04 rev 1, respectiv a plansei PL03 rev 1.

Documente care insotesc dispozitia de santier:

Plansa **D-14** - Detaliu racordare in colector cu ramnificatie tip y

Plansa **PS-04 rev1** – Plan de situatie Tronson Str. Garoafei 1

Plansa **PL-03 rev1** – Profile longitudinale canalizare gravitacionala: Tronson Str. Garoafei 1, Str. Garoafei 2, Str. Lamaitei

XALLO TEHNIC

Proiectant, SC XALLO TEHNIC SRL
ing. Daniel Dorofteese

Executant, S.C. ALAVAL PROD COM S.R.L.

Beneficiar, Comuna Grosi

Diriginte de santier, Ing. Ghise Georgel-Catalin

Verificator, Ing. David Hepea





ALAVAL

Str. Mihai Eminescu, nr. 93
430395 Baia Mare, Jud: Maramures
Capital social: 400.200,00 RON
Tel : +(40) 262 211050
Fax: +(40) 262 215551
e-mail: office@alaval.ro



Lucrare	Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, comuna Grosi, judetul Maramures
Obiect	Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, comuna Grosi, judetul Maramures
Către	Primaria GROSI, Diriginte de Santier
Tip document	Adresa



Nr. Inregistrare: 228 /26.03.2025

Catre,

COMUNA GROSI

Str. Mihai Viteazu, nr.50, localitatea Grosi, judetul Maramures

In atentia – D-lui PRIMAR Florin – Daniel Boltea

Subiect: Inaintare Note de Constatare – strada Garoafei 1 – retea de canalizare menajera – UAT Grosi , localitatea Satu Nou de Jos

Subscrisa S.C. ALAVAL PROD COM S.R.L., cu sediul în localitatea Dumbrăvița, nr. 30, județul Maramureș, punct de lucru municipiul Baia Mare, str. Mihai Eminescu, Nr. 93, județul Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș, sub nr. J24/257/1995, cod fiscal RO7174810, având contul nr. RO95 WBAN 2511 0000 7450 0013 deschis la Banca INTESA SANPAOLO Sucursala Baia Mare, reprezentată de dl.Parăscineți Ioan, cu funcția de administrator, în calitate de EXECUTANT : va comunicam punctual, urmatoarele :

In urma trasarii retelei de canalizare menajere de pe strada Garoafei 1, a situatiei reale din teren cat si in urma intalnirii din teren a tuturor factorilor decizionali, va transmitem Nota de Constatare nr.1 din 21.03.2025, cu privire la situatia existenta, de la amplasamentul retelei de canalizare de pe strada Garoafei 1, localitatea Satu Nou de Jos – Retea de canalizare menajera – UAT GROSI - 2 exemplare in original.



ALAVAL

Str. Mihai Eminescu, nr. 93
430395 Baia Mare, Jud: Maramures
Capital social: 400.200,00 RON
Tel: +(40) 262 211050
Fax: +(40) 262 215551
e-mail: office@alaval.ro



Atasam prezentei, urmatoarele documente :

- **NOTA DE CONSTATARE nr.1 din 21.03.2025 - Retea de canalizare menajera – amplasament strada Garoafei 1**

Cu stimă,

Reprezentant Subcontractant

Ing. Alexandru Csepei



NOTA DE CONSTATARE

REFERITOR LA CONTRACT « EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSU, JUDETUL MARAMURES »

NR .1 din 21.03.2025

Contract lucrari: " EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSU, JUDETUL MARAMURES " – strada Garoafei 1 – loc.Satu Nou de Jos, UAT Grosu , plan de situatie din proiect nr.PS – 04 – Plan de situatie – Tronson Str.Garoafei 1

CONSTATARI :

In urma trasarii retelei de canalizare, a situatiei reale din teren , cat si in urma intalnirii din teren a tuturor factorilor decizionali, pe aceasta strada s-au constatat urmatoarele :

- Colectorul de canalizare cuprins intre caminele de vizitare CM5.1.34 – CM5.1.37, in lungime de 30,30 ml – conform proiectului tehnic – parte desenata, este prevazut a fi executat partial, pe un amplasament proprietate private.
- Colectorul de canalizare cuprins intre caminele de vizitare CM5.1.37 – CM5.1.39 – CM5.1.40, in lungime de 65 ml – conform proiectului tehnic – parte desenata, este prevazut a fi executat, pe un amplasament proprietate privata

PROPUNERI :

- **Retea canalizare gravitationala – Tronson str.Garoafei 1 – localitatea Satu Nou de Jos , UAT GROSU**
- Planul de situatie pe care se regaseste situatia proiectata pentru aceasta strada, este PS – 04.
- Beneficiarul va verifica si analiza situatia prezentata mai sus , cu privire la situatia funciara a terenului si va pune la dispozitia Antreprenorului, un teren liber de sarcini, parte din domeniul public al UAT-ului.
- Proiectantul va verifica si analiza situatia prezentata mai sus si va dispune masurile si solutiile tehnice necesare, in vederea asigurarii functionalitatii, a noilor retele edilitare propuse, in cadrul proiectului tehnic.

PARTICIPANTI:

1. DIRIGINTE DE SANTIER :

ing. GHISE GEORGEL - CATALIN



2. COMUNA GROSU - SATU NOU DE JOS :

PRIMAR – FLORIN DANIEL BOLTEA



3. SEF SANTIER ANTREPRENOR – SC ALAVAL PROD.COM SRL :

Ing.NAPA RARES



**ALAVAL**

Str. Mihai Eminescu, nr. 93
430395 Baia Mare, Jud: Maramures
Capital social: 400.200,00 RON
Tel : +(40) 262 211050
Fax: +(40) 262 215551
e-mail: office@alaval.ro



Lucrare	Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, comuna Grosi, judetul Maramures
Obiect	Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, comuna Grosi, judetul Maramures
Către	Primaria GROSI, Diriginte de Santier
Tip document	Adresa

Nr. Inregistrare: 256 /07.04.2025

Catre,

COMUNA GROSI

Str. Mihai Viteazu, nr.50, localitatea Grosi, judetul Maramures

In atentia – D-lui PRIMAR Florin – Daniel Boltea



**Subiect: Inaintare Note de Constatare – retea de canalizare menajera – UAT Grosi ,
localitatea Satu Nou de Jos**

Subscrisa S.C. ALAVAL PROD COM S.R.L., cu sediul în localitatea Dumbrăvița, nr. 30, județul Maramureș, punct de lucru municipiul Baia Mare, str. Mihai Eminescu, Nr. 93, județul Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș, sub nr. J24/257/1995, cod fiscal RO7174810, având contul nr. RO95 WBAN 2511 0000 7450 0013 deschis la Banca INTESA SANPAOLO Sucursala Baia Mare, reprezentată de dl.Parăscineți Ioan, cu funcția de administrator, în calitate de EXECUTANT : va comunicam punctual, urmatoarele :

In urma trasarii retelei de canalizare menajere, a situatiei reale din teren cat si in urma intalnirii din teren a tuturor factorilor decizionali, va transmitem Nota de Constatare nr.2 din 07.04.2025, cu privire la situatia existenta, de la amplasamentul retelelor de canalizare din localitatea Satu Nou de Jos – Retea de canalizare menajera – UAT GROSI - 2 exemplare in original.



ALVAL

Str. Mihai Eminescu, nr. 93
430395 Baia Mare, Jud: Maramures
Capital social: 400.200,00 RON
Tel : +(40) 262 211050
Fax: +(40) 262 215551
e-mail: office@alaval.ro



Atasam prezentei, urmatoarele documente :

- **NOTA DE CONSTATARE nr.2 din 04.04.2025** - Retea de canalizare menajera – amplasament retele de canalizare menajera.

Cu stimă,

Reprezentant Antreprenor

Ing. Alexandru Csepei



NOTA DE CONSTATARE

REFERITOR LA CONTRACT « EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSI, JUDETUL MARAMURES »

NR .2 din 04.04.2025

Contract lucrari: " EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSI, JUDETUL MARAMURES " – retea canalizare menajera – loc.Satu Nou de Jos, UAT Grosi , plan de situatie din proiect PS 00 – Plan general retele canalizare – Satu Nou de Jos

CONSTATARI :

In urma trasarii retelei de canalizare, a situatiei reale din teren , cat si in urma intalnirii din teren a tuturor factorilor decizionali, pe aceasta strada s-au constatat urmatoarele :

- Prin descarcarea a 3 sau 4 racorduri individuale DN 160, intr-un element de camin de vizitare nearmat, in care uneori exista si o rupere de panta in partea superioara cu o intrare de DN250, rezistenta acestuia va fi salabita considerabil
- Racordarea gospodariilor in colectorul retelei de canalizare DN250, va conduce la evitarea afectarii suprafetei carosabile a drumului pe portiuni mai mari, ne mai fiind necesara traversarea racordurilor, pana la caminele de vizitare.

PROPUNERI :

- **Retea canalizare gravitationala – localitatea Satu Nou de Jos , UAT GROSI**
 - Planul de situatie pe care se regaseste situatia proiectata pentru aceasta strada, este PS – 00
 - Se propune, ca in situatiile in care intr-un camin de vizitare sunt necesare 2 sau mai multe carotari, racordarea gospodariilor (imobilelor) sa se faca in colectorul retelei de canalizare menajera DN250, prin intermediul unei ramificatii de tip " Y ".
 - Proiectantul va verifica si analiza situatia prezentata mai sus si va dispune masurile si solutiile tehnice necesare, in vederea asigurarii functionalitatii, a noilor retele edilitare propuse, in cadrul proiectului tehnic.

PARTICIPANTI:

1. DIRIGINTE DE SANTIER :

ing. GHISE GEORGEL - CATALIN



2. COMUNA GROSI - SATU NOU DE JOS :


¹ PRIMAR – FLORIN DANIEL BOLTEA



3. SEF SANTIER ANTREPRENOR – SC ALAVAL PROD COM SRL :

Ing.NAPA RARES




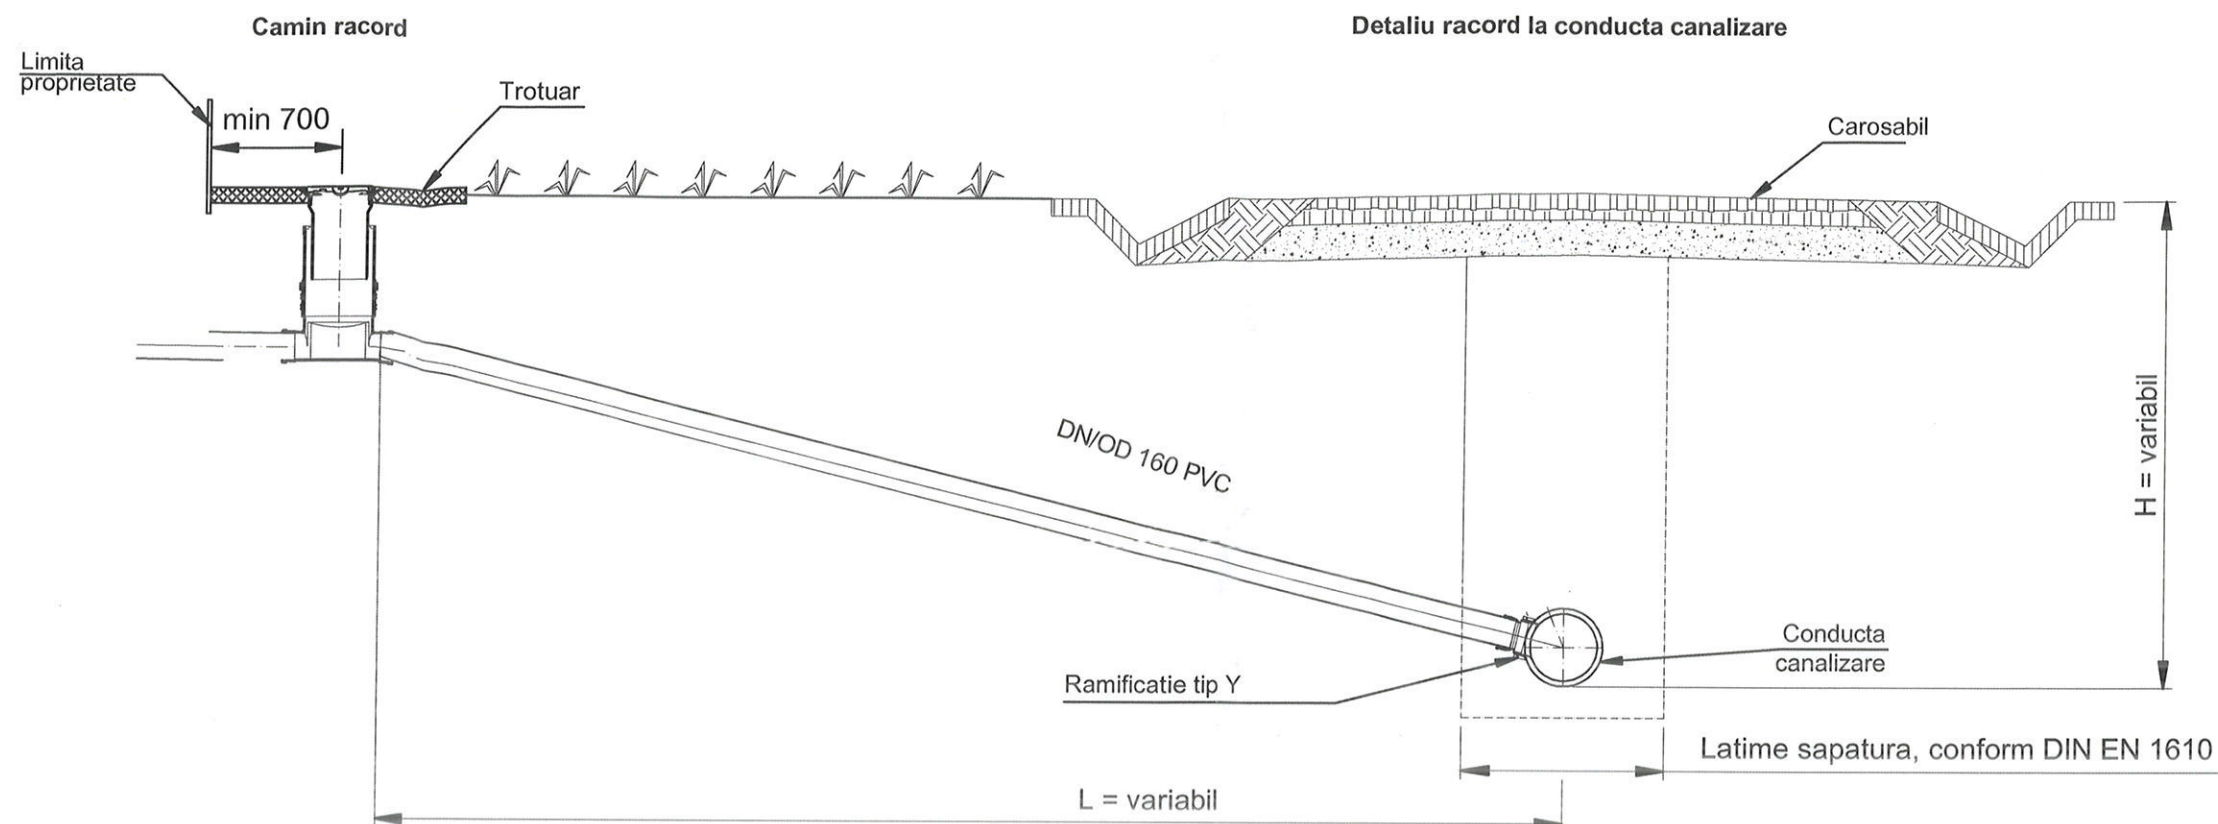



NOTA 1:

Adâncimea de pozare a conductei de racord va fi minim adâncimea de îngheț.
Racordarea se va face până la limita de proprietate, pe spațiu public.
La montarea caminului se va ține cont de caietele de sarcini și de recomandările producătorului.
Fiecare racord va fi prevăzut cu camin de racord și dop înspre instalația de canalizare interioară a proprietății.
Toate materialele și echipamentele vor fi montate conform recomandărilor producătorului.
Între căminul de racord și colectorul stradal se realizează exclusiv tronsoane rectilinii (nu se admite instalarea de coturi pe traseul conductei de racord).
În funcție de situația întâlnită în teren se vor combina tipurile de racorduri prezentate, atât din punct de vedere al traseelor cât și a tipurilor de camin de racord.




	ing. David Hepea		SAAC	43/11.06.2024	
Verificator/ expert	Prenume/Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza nr./Data	
Proiectant S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. Str. Victor Babes nr. 15/4, Baia Mare, Maramures			"EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA ÎN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSU, JUDEȚUL MARAMUREȘ"		Pr. nr. XT 211/2024
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Detaliu racordare în colector cu ramnificatie tip Y	Faza: PTE
Resp. proiect	ing. Daniel Dorofteese				Plansa D-14
Proiectat	ing. Rares Maris		Data: Mai 2024		Rev. 0
Desenat	ing. Daniel Dorofteese			Beneficiar: COMUNA GROSU	

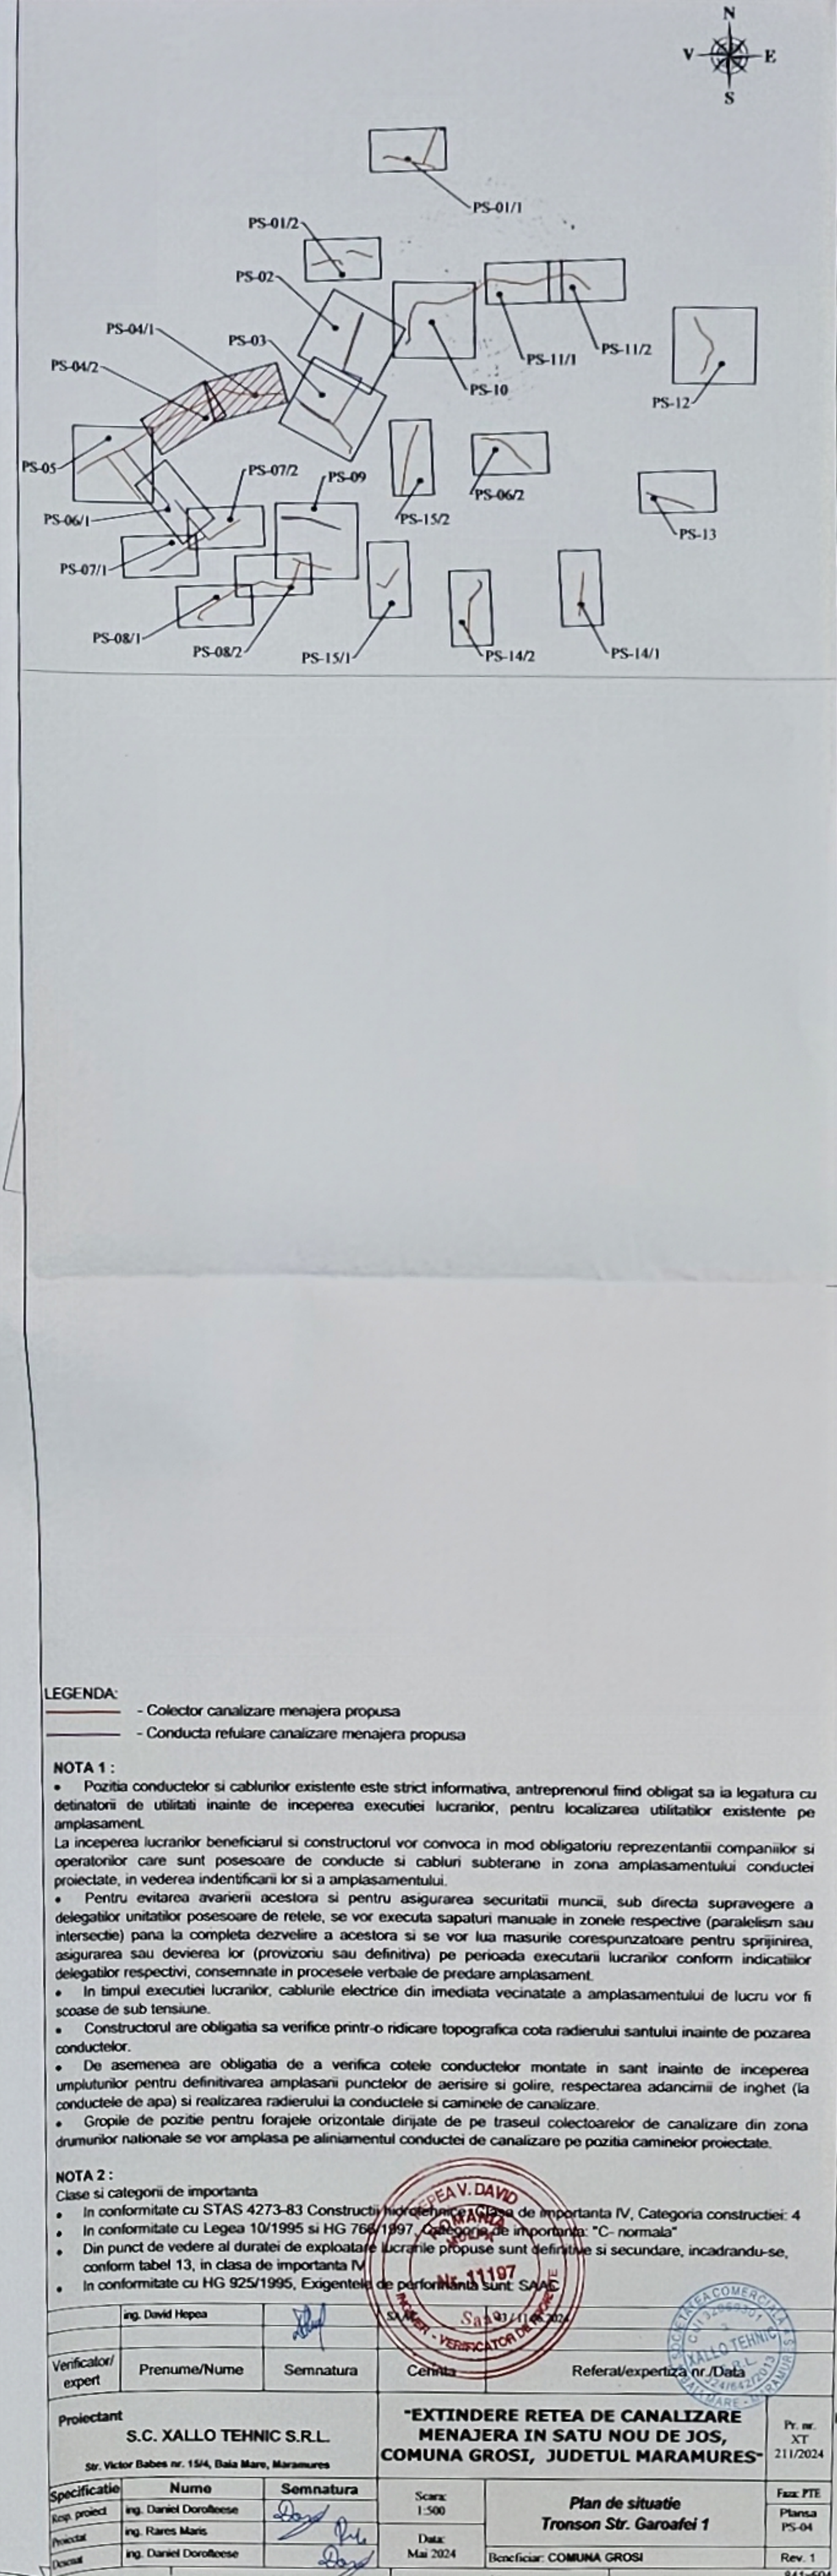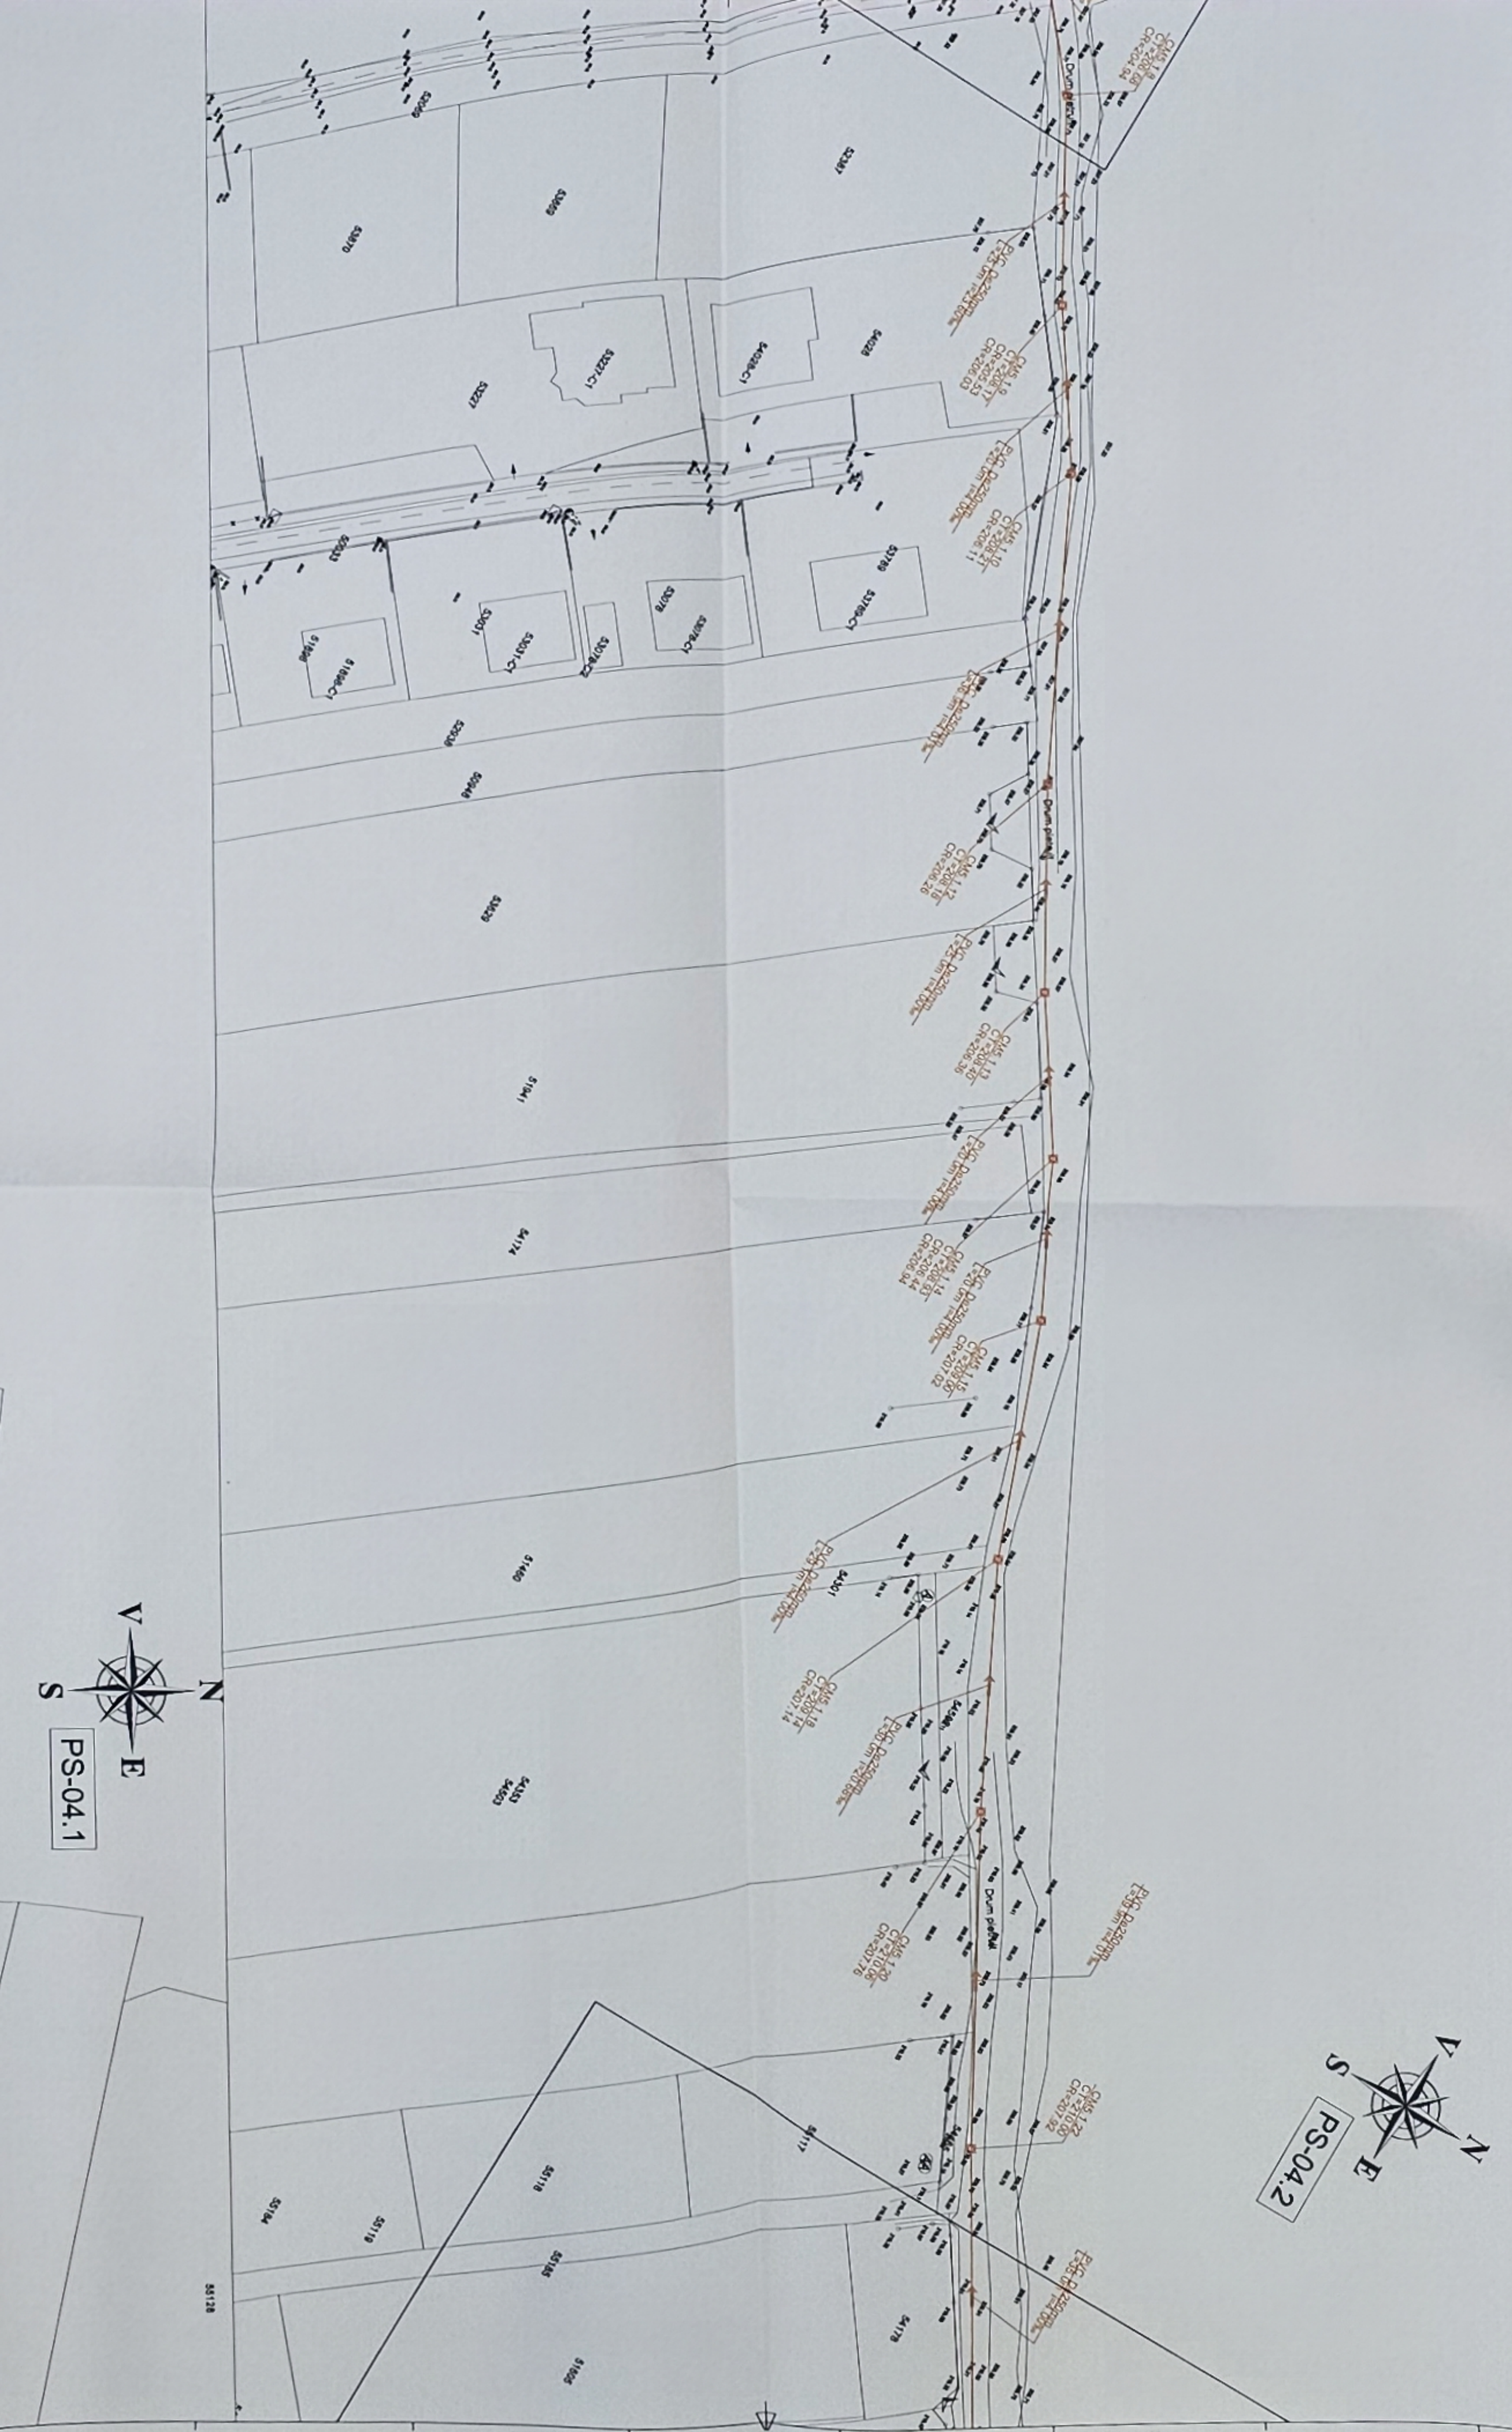


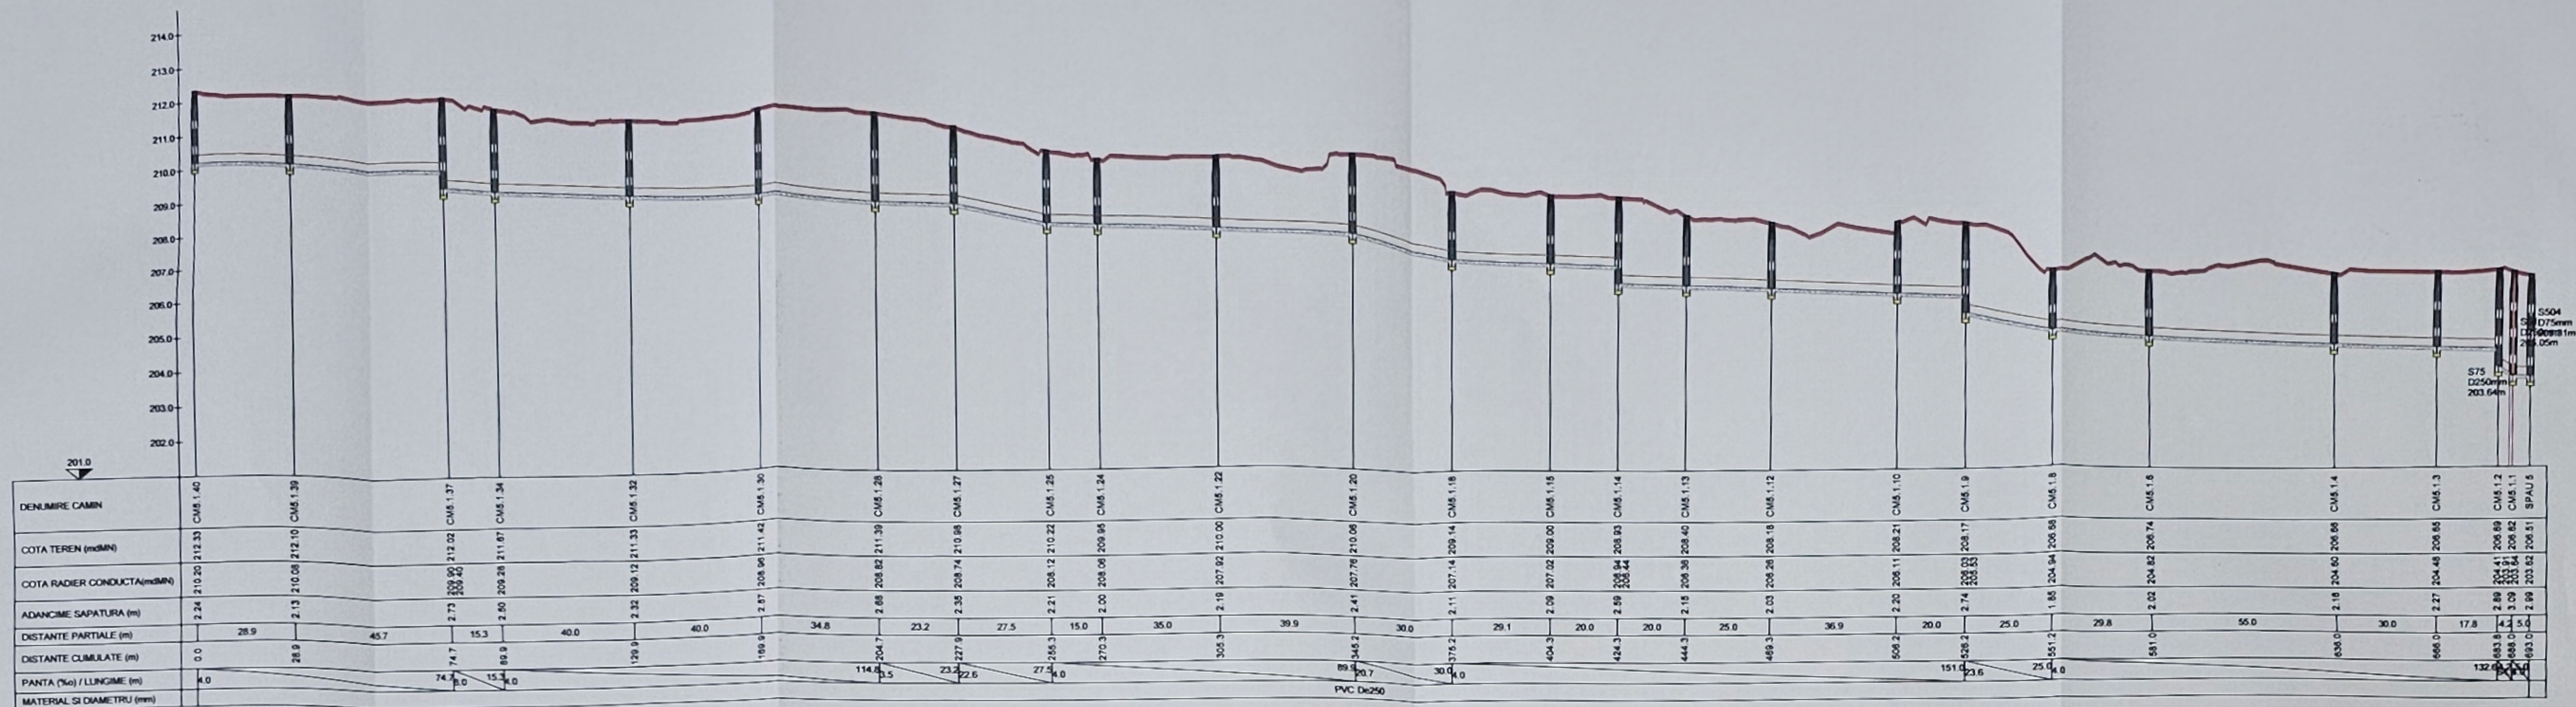

PROFIL LONGITUDINAL-Str. Garoafei 1

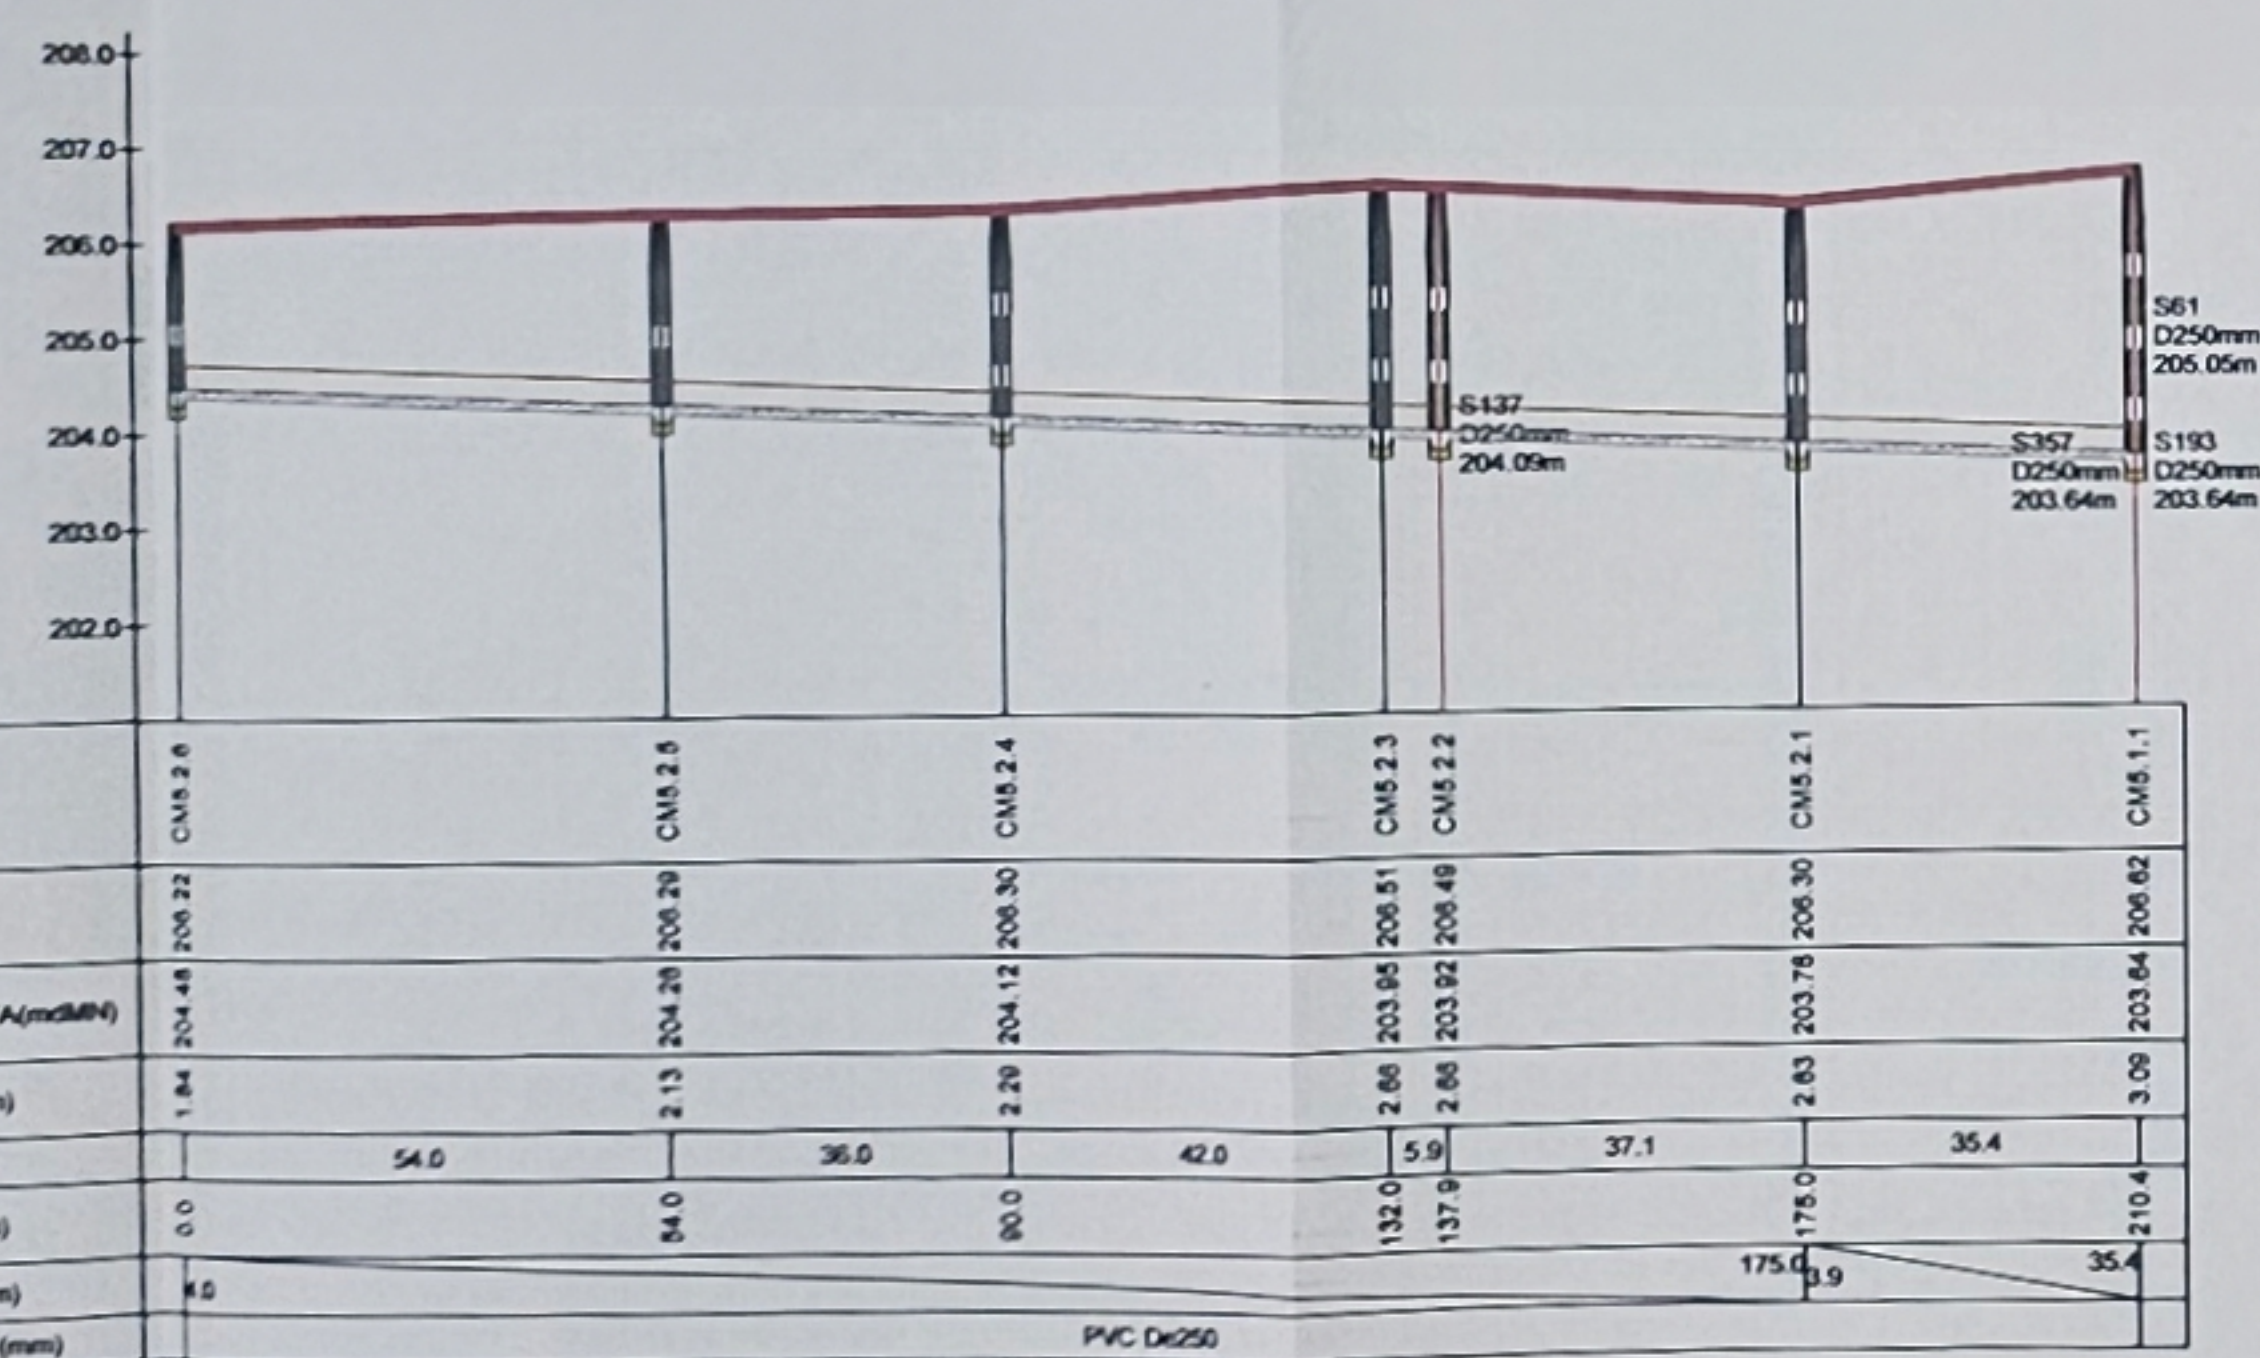

PROFIL LONGITUDINAL-Str. Garoafei 2

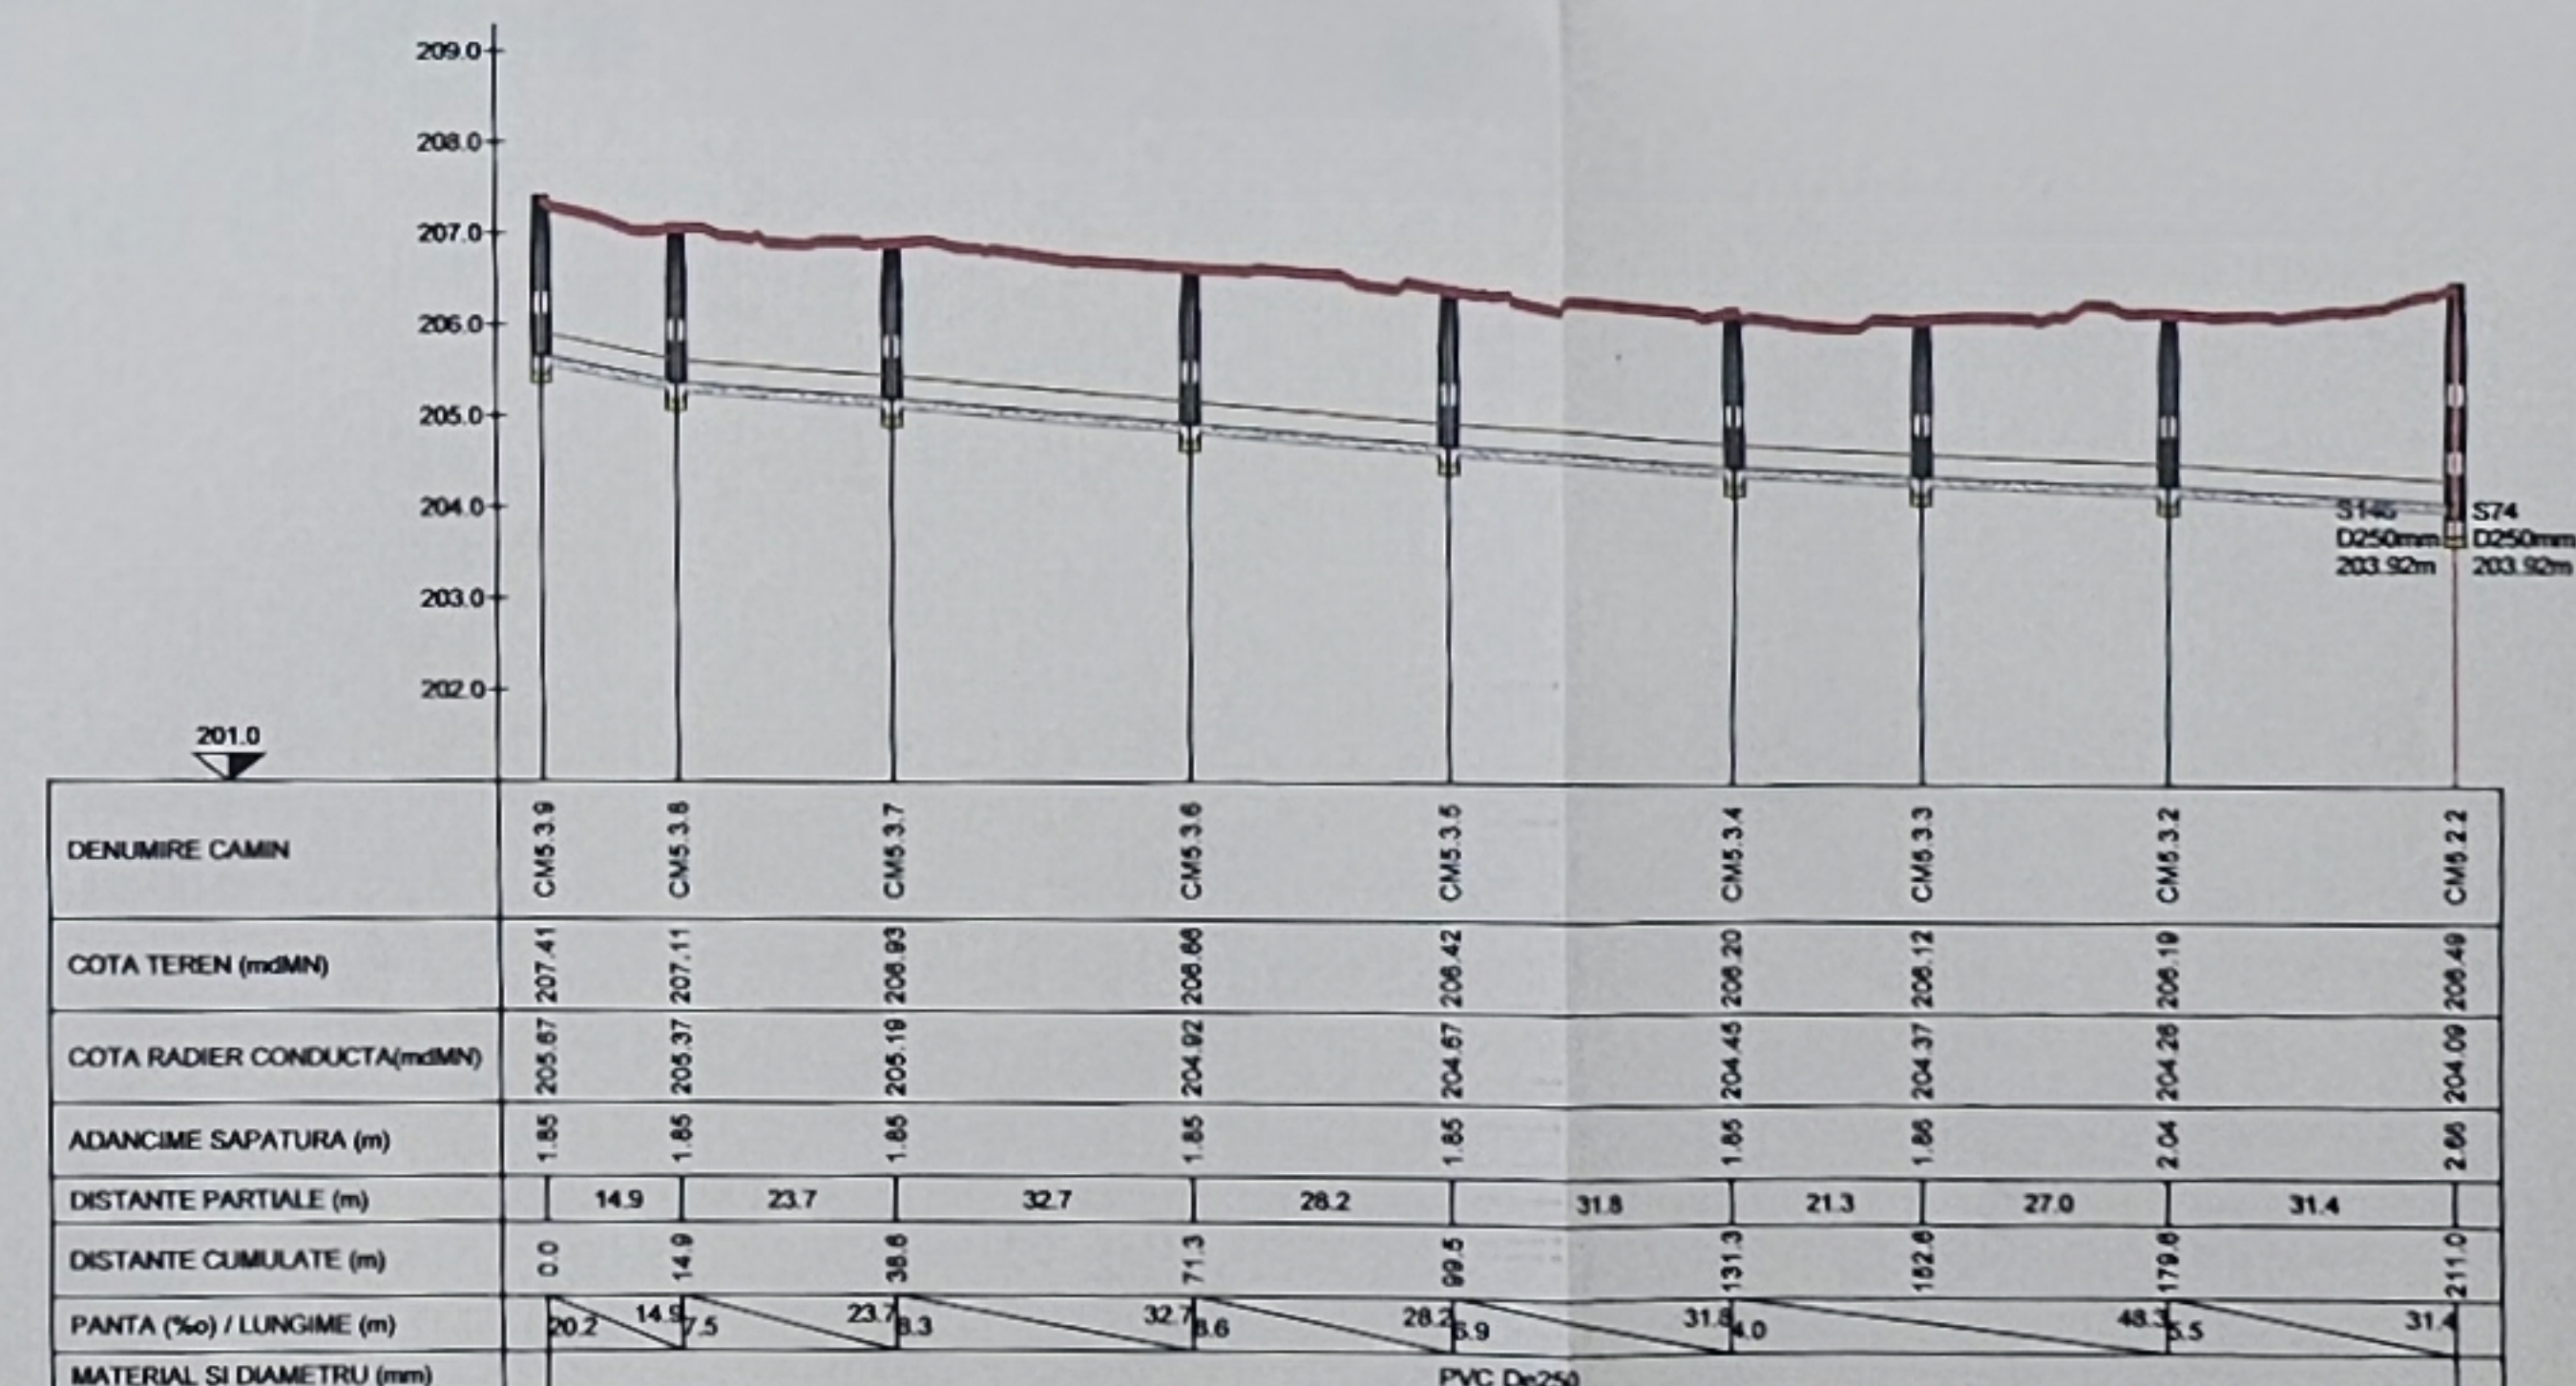

PROFIL LONGITUDINAL-Str. Lamaitei

NOTA:

- Profilul conductelor si cablurilor existente este strict informativ, anteprenorul fiind obligat sa ia legatura cu detinatorii de utilitati inainte de inceperea executiei lucrarilor, pentru localizarea utilitatilor existente pe amplasament.
- La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor comunica in mod obligatoriu reprezentantii companiilor si operatorilor care sunt posesorii de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea indentificarii lor si a amplasamentului.
- Pentru evitarea anarhiei instalarii si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directia supravegherii a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective (paralelism sau intersectie) pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru siguranța, integritatea sau dezinfectarea (pentru rețeaua sau deșeurile) pe perioada executării lucrărilor conform indicatelor delegatilor respectivi, consemnate in procesele verbale de predare amplasament.
- In timpul executiei lucrarilor, cablurile electrice din imediata vecinatate a amplasamentului de lucru vor fi scuzate de sub terasament.
- Constructorul este obligat sa verifice prent o ridicare topografica cota radierului santului inainte de pozarea conductelor.
- De asemenea este obligat sa verifice cotele conductelor montate in sant inainte de inceperea umpluturilor pentru definitivarea amplasarii punctelor de aerisire si golire, respectarea adancimii de inghet (la conductele de apa) si realizarea radierului la conductele si canalele de canalizare.
- Grupul de proiect pentru lucrările executate de pe traseul colectoarelor de canalizare din zona drumurilor nationale se vor amplasa pe aliniamentul conductei de canalizare pe pozitia caminilor proiectate.

NOTA:

- Clasa si categoria de importanta
- In conformitate cu STAS 4273-83 Construcții hidrotehnice, Clasa de importanta IV, Categoria constructiilor 4
- In conformitate cu Ungia 101/1995 si HG 1062/1997, Categoria de importanta: "C-normala"
- De la punct de vedere al duratei de exploatare lucrările propuse sunt defectiv si secundare, incadrându-se, conform tabel 13, in clasa de importanta IV
- In conformitate cu HG 925/1999, Exigentele de performanta sunt: Is

Verificator/ expert: ing. David Hepoa

Proiectant: S.C. XALLO TENNIC S.R.L.

Str. Victor Babeș nr. 154, Bala Mare, Maramures

Verificator/ expert: ing. Daniel Dorobanescu

Proiectat: ing. Rares Marin

Executat: ing. Daniel Dorobanescu

Semnatura: [Signature]

Semnatura: [Signature]

Semnatura: [Signature]

Cerinta: [Blank]

Referat/expertiza nr./Data: [Blank]

Scara: 1:100 / 1:1000

Data: Mai 2024

Beneficiar: COMUNA GROSI

Rev. 1

841-6
