



IMPO
construct



Servicii de proiectare, consultanță și dirigenție de șantier

Adresă: Bulevardul George Enescu, Nr.16, Parter, Suceava
cod fiscal RO14700144, nr. inregistrare J33/321/2002
ING BANK: RO78 INGB 0000 9999 0528 0478 ING BANK SV
Cont Trezorerie: RO68 TREZ 5915 069X XX00 1237
e-mail: contact@impoconstruct.ro

DISPOZITIE DE SANTIER NR.1/21.07.2021

PROIECT NR. 1218/2018

FAZA: P.T./D.E.

**DENUMIRE PROIECT: „Extindere retea de canalizare in Satu Nou de Jos,
comuna Grosi, judetul Maramures”**

ADRESA OBIECTIV: SATU NOU DE JOS, JUD. MARAMURES

BENEFICIAR: PRIMARIA COMUNA GROSI , JUD. MARAMURES

PROIECTANT: SC IMPOCONSTRUCT SRL

BORDEROU PIESE DESENATE:

- **Plansa nr. D09 rev.1**



COMUNA GROSI, IULIE 2021



IMPOconstruct



Adresă: Bulevardul George Enescu, Nr. 16, Parter, Suceava
cod fiscal RO14700144, nr. înregistrare J33/321/2002
ING BANK: RO78 INGB 0000 9999 0528 0478 ING BANK SV
Cont Trezorerie: RO68 TREZ 5915 069X XX00 1237
e-mail: contact@impoconstruct.ro

Servicii de proiectare, consultanță și dirigenție de șantier

DISPOZITIE DE SANTIER NR.1/21.07.2021

REFERITOR: PROIECT NR. 1218/2018 : „Extindere retea de canalizare in Satu Nou de Jos, comuna Grosi, judetul Maramures”,

CONTRACT: NR. 20/ 17.06.2020: „Extindere retea de canalizare in Satu Nou de Jos, comuna Grosi, judetul Maramures”,

Ca urmare a notelor de constatare :

1. Nr.1/17.03.2021 – referitoare la structura rutiera pe strazi
2. Nr. 2/17.03.2021 – referitoare la cantitati pentru sapatura
3. Nr. 3/01.07.2021 – referitoare solutiilor alternative corp statie pompare apa uzata

Prin prezenta dispozitie de santier se dispune:

1. Structura rutiera pe strazile asfaltate va fii urmatoarea:
asfalt BA16 = 5 cm, piatra sparta 0-63 = 15 cm, balast 0-31 = 25 cm. Latimea suprafetei de refacere structurii rutiere pe zona transeei de colector principal este de l=1.5 m, iar pentru conducta de racord l=1.2 m.
2. Structura rutiera pe strazile cu macadam va fii urmatoarea:
piatra sparta 0-63 = 15 cm, balast 0-31 = 25 cm. Latimea suprafetei de refacere structurii rutiere pe zona transeei de colector principal este de l=1.5 m, iar pentru conducta de racord l=1.2 m

Strada	Colector principal	Conducta racord
Ciresilor	2153,00 ml	510,50 ml
Baii	399,00ml	160,00 ml
Republicii (DJ182B)	786,00 ml	170,00 ml
Narciselor	634,90	96,50 ml



IMP construct



Adresă: Bulevardul George Enescu, Nr.16, Parter, Suceava
cod fiscal RO14700144, nr. inregistrare J33/321/2002
ING BANK: RO78 INGB 0000 9999 0528 0478 ING BANK SV
Cont Trezorerie: RO68 TREZ 5915 069X XX00 1237
e-mail: contact@impoconstruct.ro

Servicii de proiectare, consultanță și dirigenție de șantier

Pasunii (DC48)	580,00	146,00 ml
Livezii	684,05l	127,50 ml
Scolii	632,05 ml	123,00 ml
TOTAL	5869,00 ml	1333,50 ml

Pentru realizarea refacerilor de drum pe strazile din tabelul de mai sus se vor prevedea suplimentar in listele de deviz urmatoarele cantitati:

1. Refacere structura rutiera peste colectorul principal:

- Sapatura man.: 872,82 mc
- Sapatura mec.: 2618,00 mc
- Transport sapatura: 6934,68 to
- Balast: 2182,045 mc
- Piatra sparta: 1309,225 mc
- Transport agregate: 5815,15 to
- Mixtura asfaltica : 94.45 to
- Transport mixtura: 94.45 to

2. Refacere structura rutiera peste conducta de racorduri individuale:

- Mixtura asfaltica : 22.025 to
- Transport mixtura: 22.025 to



IMPO construct



Adresă: Bulevardul George Enescu, Nr.16, Parter, Suceava
cod fiscal RO14700144, nr. inregistrare J33/321/2002
ING BANK: RO78 INGB 0000 9999 0528 0478 ING BANK SV
Cont Trezorerie: RO68 TREZ 5915 069X XX00 1237

Servicii de proiectare, consultanță și dirigenție de șantier e-mail: contact@impoconstruct.ro

3. Pentru realizarea racordurilor individuale cu lungimea totala de 1333,50 ml

(sapaturi, umpluturi, asternere nisip, compactari, incarcare si transportare) se vor prevedea suplimentar in listele de deviz urmatoarele cantitati:

- Sapatura: 1280,16 mc
- Imprastiere: 1280,16 mc
- Compactarea: 1066.80 mc
- Incarcarea materialelor: 448,056 to
- Transportul materialelor: 1641,80 to
- Umplutura cu nisip: 78,83 mc

4. Toate elementele statiilor de pompare ape uzate din PAFSIN se vor inlocui cu elemente din PEID. Avantajele inlocuirilor sunt mentionate in nota de constatare nr. 3/01.07.2021.

5. La prezenta, se anexeaza:

- Nota de constatare Nr.1/17.03.2021 – referitoare la structura rutiera pe strazi
- Nota de constatare Nr. 2/17.03.2021 – referitoare la cantitati pentru realizare montaj conducta racord
- Nota de constatare Nr. 3/01.07.2021 – referitoare solutii alternative corp statie pompare apa uzata
- Plansa nr. D09 rev.1
- Lista de cantitati: 100701 – Refacere drum colector principal NCS
- Lista de cantitati: 100704 – Racorduri – sapatura sant NCS
- Lista de cantitati: 100706 – Refacere drum racorduri NCS
- Lista de cantitati: 100101 – Terasamente retea de canalizare NR
- Lista de cantitati: 100102 – Colector principal canalizare NR
- Lista de cantitati: 100103 – Refacere drumuri NR
- Lista de cantitati: 100104 – Refacere podete NR
- Lista de cantitati: 100204 – Imprejmuire SPAU1-SPAU2 NR
- Lista de cantitati: 100205 – Conducta refulare NR



IMPO construct



Adresă: Bulevardul George Enescu, Nr.16, Parter, Suceava
cod fiscal RO14700144, nr. înregistrare J33/321/2002
ING BANK: RO78 INGB 0000 9999 0528 0478 ING BANK SV
Cont Trezorerie: RO68 TREZ 5915 069X XX00 1237
e-mail: contact@impoconstruct.ro

Servicii de proiectare, consultanță și dirigenție de șantier

- **Lista de cantitati: 100301 – Racorduri individuale NR**
- **Lista de cantitati: 100302 – Refacere podete NR**
- **Lista de cantitati: 100304 – Refacere drumuri NR**
- **Lista de cantitati: 100501 – Racorduri electrice statii de pompe NR**
- **Lista de cantitati: 100601 – Organizare de santier NR**

Executant:

SC TEHNODOMUS SRL



Diriginte de santier:

Ing. DOROLTI Vasile



Proiectant:


SC IMPOCONSTRUCT SRL



Beneficiar:

PRIMARIA COMUNA GROSU

Verificator:

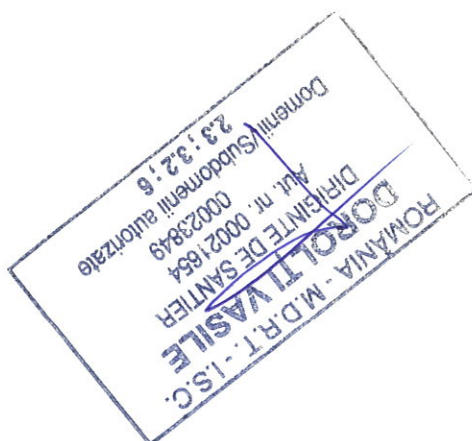

Obiectiv: Extindere retea de canalizare in S. u Nou de Jos, comuna Grosi, Maramur
Contract: Nr.20/ 17.06.2020

CENTRALIZATOR
investitii cu NR-NCS 2021

Cod de viz	Nr.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare conform CONTRACT	Valoare NR	Valoare NCS	Valoare finala cu NR-NCS	Decontat anterior in 2020	Decontat in 2021	Decontat cumulat	Rest de decontat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	12	13
100101	Ob,1	RETEA DE CANALIZARE MENAJERA								
100102		Terasamente retea de canalizare	963,267.16	35,196.73	0.00	928,070.43	649,872.72	275,112.73	924,985.45	3,084.98
100103		Colector principal canalizare	1,083,499.50	5,252.08	0.00	1,078,247.42	637,342.94	423,981.38	1,061,324.32	16,923.10
100104		Refacere drumuri	234,692.85	61,485.55	608,591.49	781,798.79	0.00	62,455.86	62,455.86	719,342.93
		Refacere podete	193,914.55	180,944.91	0.00	12,969.64	0.00	0.00	0.00	12,969.64
		Total Ob,1	2,475,374.06	282,879.27	608,591.49	2,801,086.28	1,287,215.66	761,549.97	2,048,765.63	752,320.65
100201	Ob,2	STATII DE POMPARE								
100202		Terasamente	3,323.70	0.00	0.00	3,323.70	0.00	0.00	0.00	3,323.70
100203		C-tii SPAU1 - SPAU2	13,637.92	0.00	0.00	13,637.92	0.00	0.00	0.00	13,637.92
100204		Montaj utilaje la SPAU1 - SPAU2	11,446.29	0.00	0.00	11,446.29	0.00	0.00	0.00	11,446.29
100205		Imprejmuire SPAU1 - SPAU2	40,248.09	40,248.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Conducta refulare	206,428.23	9,491.02	0.00	196,937.21	0.00	167,860.95	167,860.95	29,076.26
		Utilaje, echipamente tehnologice	341,329.95	0.00	0.00	341,329.95	0.00	0.00	0.00	341,329.95
		Total Ob,2	616,414.18	49,739.11	0.00	566,675.07	0.00	167,860.95	167,860.95	398,814.12
100301	Ob,3	RACORDURI DE CANALIZARE								
100302		Racorduri individuale	565,565.67	262,708.79	82,986.55	385,843.43	112,922.83	189,934.05	302,856.88	82,986.55
100303		Refacere podete	81,326.28	81,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100304		Subtraversari DJ	65,430.18	0.00	0.00	65,430.18	0.00	65,430.18	65,430.18	0.00
		Refacere drumuri	45,883.16	2,130.21	6,835.27	50,588.22	0.00	17,524.05	17,524.05	33,064.17
		Total Ob,3	758,205.29	346,165.28	89,821.82	501,861.83	112,922.83	272,888.28	385,811.11	116,050.72
100401	Ob,4	SUBTRAVERSARE STR.DUMBRAVEI-NEELIGIBIL								
		Subtraversare prin sapatura	13,394.58	0.00	0.00	13,394.58	0.00	13,394.58	13,394.58	0.00
		Total Ob,4	13,394.58	0.00	0.00	13,394.58	0.00	13,394.58	13,394.58	0.00
100501	Ob,5	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA								
		Racorduri electrice statii de pompe	15,527.01	15,527.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Ob,5	15,527.01	15,527.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obiectiv: Extindere retea de canalizare in Său Nou de Jos, comuna Grosi, Maram

Contract: Nr.20/ 17.06.2020

CENTRALIZATOR
investitii cu NR-NCS 2021

Cod deviz	Nr.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare conform CONTRACT	Valoare NR	Valoare NCS	Valoare finala cu NR-NCS	Decontat anterior in 2020	Decontat in 2021	Decontat cumulat	Rest de decontat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	12	13
100601	Ob.5	ORGANIZARE DE SANTIER								
		ORGANIZARE DE SANTIER								
		Total Ob,2	82,923.63	4,102.64	0.00	78,820.99	0.00	75,032.64	75,032.64	3,788.35
			82,923.63	4,102.64	0.00	78,820.99	0.00	75,032.64	75,032.64	3,788.35
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	3,961,838.76	698,413.31	698,413.31	3,961,838.76	1,400,138.49	1,290,726.42	2,690,864.91	1,270,973.85
		Taxa pe valoarea adaugata	752,749.36	132,698.53	132,698.53	752,749.36	266,026.31	245,238.02	511,264.33	241,485.03
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :	4,714,588.12	831,111.84	831,111.84	4,714,588.12	1,666,164.80	1,535,964.44	3,202,129.24	1,512,458.88

CONSTRUCTOR
SC TEHNODOMUS SRL ARAD



BENEFICIAR,
PRIMARIA COMUNEI GROSU

