ANEXA NR. 1

XALLO TEHNIC

Dispozitie de santier
Nr. 005 / 28.05.2026
SANTIER Grosi

Obiectiv investitie:	**„Infiintare retea de canalizare in localitatea Grosi, comuna Grosi, judetul Maramures"**
Cod Proiect:	**XT139/2023**
Amplasament:	**comuna Grosi, jud. Maramures**
Beneficiar:	**Comuna Grosi**
Proiectant:	**SC XALLO TEHNIC SRL**
Executant:	**SC AMI S.A.**

Informatii care fondeaza emiterea dispozitiei

Prezenta dispozitie de santier se emite in urma trasarii lucrarilor pe teren, in stransa legatura cu indicatiile executantului si a dirigintelui de santier, materializat prin nota de santier, cu scopul de a corela si optimiza situatiile aparute in perioada de executie a lucrarilor, rezultand necesitatea adaptarii la teren a caminelor de racord.

DISPUNEM:

- Renuntarea montarii placilor de beton de la caminele de racord pentru situatiile, punctuale, prezentate in nota de santier atasata.
- Se vor inainta spre decontare cantitatile de lucrari real executate stabilite in urma masuratorilor „as-build", confirmate in teren de dirigintele de santier.

Documente care insotesc dispozitia de santier:

- Plansa D-11 Detaliu tip camin racord fara placaa beton

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de CONSTRUIRE / DESFIINTARE
Nr. 36 02 din 08 23 20
ARHITECT ȘEF

Proiectant,	SC XALLO TEHNIC SRL ing. Daniel Dorofteese
Executant,	S.C. AMI S.A.
Beneficiar,	Comuna Grosi
Diriginte de santier,	Ing. Costin Dumitru Ioan
Verificator,	Ing. Dan Calugaru

ROMANIA-M.D.R.T.-S.C
COSTIN DUMITRU IOAN
DIRIGINTE DE SANTIER
NR. 0005105; 00023622
DOMENII/SUBDOMENII

CĂLUGĂRU C. DAN
ROMÂNIA
NR. 05844
Is; It; G
A; B; C; D; E; F
INGINER VERIFICATOR PROIECTE

S.C. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.

430392 - Baia Mare, Str. Aleea Electrolizei, Nr. 1
tel/fax: 0040 262 212862 ; 0040 262 215015
E-mail: office@amisa.ro www.amisa.ro
J24/164/1991 - C.U.I. 2196150 - Atribut fiscal RO
IBAN RO34BTRL02501202W59248XX
Banca TRANSILVANIA – Baia Mare

TÜV AUSTRIA CERTIFIED
TÜV AUSTRIA CERT GMBH
EN ISO 9001 201001 83004804
EN ISO 14001 201041 83004805
ISO 45001 201162 13010420

Nr 457/24.08.2026

COMUNA GROȘI
INTRARE Nr. 7042
IEȘIRE
Ziua 24 Luna 08 Anul 2026

Catre , Primaria comunei Grosi, judetul Maramures

In atentia d-lui Boltea Florin Daniel – primar comuna Grosi contact@primariagrosi.ro

Referitor la Infiintare retea canalizare in localitatea Grosi, com.Grosi, jud.Maramures

Contract 03/ 06.02.2024

Subiect ***DS Nr.5/28.05.2026***

Va transmitem, in 3exemplare, evaluarea financiara si ofertele de pret pentru materialele fara corespondent in oferta in vederea verificarii si aprobarii.

Cu stima,

Director General Antrepriza Montaj Instalatii SA

Pop Radu Gabriel

S.C. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A. J 24-164-1991 ROMÂNIA RO 2196150 BAIA MARE

Obiectiv: Infiintare retea canalizare in localitatea Grosi, com.Grosi,jud.MM
Contract: 03/06.02.2024 Cod CPV: 45232400-6
Beneficiar: Comuna GROSI
Executant: Antrepriza Montaj Instalatii SA

CENTRALIZATOR MODIFICARI CONFORM DISPOZITII DE SANTIER


Cod Obiect/ deviz	Descriere deviz	Valoare contract (exclusiv TVA)					
		Initial	DS1/28.06.24-anterior	DS2/20.09.24-anterior	DS4/ 17.10.2025	DS5/ curent	Curent
1.3	**Amenajari pt. prot. mediului si aducerea terenului la starea initiala**	**4,873,977.72**	**-**	**- 1,620.34**	**- 650,948.02**	**- 153,746.87**	**4,067,662.49**
958003	Aducerea terenului la starea initiala retea canalizare gravitationala	3,746,513.56		- 1,620.34	- 646,271.73	- 153,746.87	2,944,874.62
958011	Aducerea terenului la starea initiala conducte de refulare	1,127,464.16			- 4,676.29		1,122,787.87
2	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor**	**22,383.06**	**-**	**-**	**-**		**22,383.06**
958010	Alimentare cu energie electrica statii de pompare	22,383.06					22,383.06
4.1	**Constructii si instalatii**	**7,558,969.37**	**23,137.02**	**62,930.32**	**1,291,143.26**	**- 16,375.84**	**8,919,804.13**
Ob1	**Retea canalizare gravitationala**	**6,309,263.76**	**-**	**-**	**- 524,960.18**	**- 6,238.33**	**5,778,065.25**
958001	Retea de canalizare gravitationala-instalatii	5,106,431.67			- 459,803.09	- 6,238.33	4,640,390.25
958002	Racorduri	1,202,832.09			- 65,157.09		1,137,675.00
Ob2	**Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare**	**1,249,705.61**	**- 30,121.46**	**-**	**- 56,824.02**	**-**	**1,162,760.13**
958005	Camine de vane pe reteaua de refulare-constructii	127,921.22					127,921.22
958007	Statii de pompare - constructii	206,498.31					206,498.31
958008	Statii de pompare-Instalatii electrice	57,695.03					57,695.03
958004	Retea refulare statii de pompare	833,143.19	- 30,121.46		- 56,824.02		746,197.71
958006	Camine de vane pe reteaua de refulare-instalatii	24,447.86					24,447.86
DS1/28.06 - lucrari suplimentare		**-**	**53,258.48**	**-**	**-**	**-**	**53,258.48**
958013	Supratraversare V. Carbunareasa-articole noi	-	5,682.51				5,682.51
958113	Supratraversare V. Carbunareasa-articole oferta	-	7,930.69				7,930.69
958014	Racorduri- art noi	-	20,536.04				20,536.04
958015	Racorduri art of		10,100.04				10,100.04
DS2/20.09- lucrari suplimentare		**-**	**-**	**62,930.32**	**-**	**-**	**62,930.32**
958103	Aducerea terenului la starea initiala			51,027.03			51,027.03
958110	Coloana electrica cablu SPAU 8			6,008.33			6,008.33
958213	Coloana electrica cablu CYABY 5X16 L=120 m			5,894.96			5,894.96
DS4/- lucrari suplimentare		**-**			**1,872,927.46**	**- 101,089.84**	**1,771,837.62**
958115	Retea de canalizare gravitationala+racord-instal. si carotare art.noi				50,501.56		50,501.56
958134	Terasamente sapatura in stanca				255,097.64		255,097.64
958143	Aducerea terenului la starea initiala si refacere rigola				1,137,686.07		1,137,686.07
958144	Aducerea terenului la starea initiala Joseni				429,642.19	- 101,089.84	328,552.35
DS5/- lucrari suplimentare		**-**				**90,952.33**	**90,952.33**
958150	Racorduri (42 buc.)					82,339.99	82,339.99
958151	Refacere rigola 12.5 ml - elemente prefabricate					8,612.34	8,612.34
4.2	**Montaj utilaje si echipamente tehnologice**	**129,041.49**	**-**				**129,041.49**
958009	Montaj statii de pompare	129,041.49					129,041.49
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj**	**1,486,782.00**			**35,702.00**		**1,522,484.00**
TOTAL constructii si instalatii , exclusiv TVA		**14,071,153.64**	**23,137.02**	**61,309.98**	**675,897.24**	**- 170,122.71**	**14,661,375.17**
5.1.1	**Organizare de santier**	**26,380.98**					**26,380.98**
TOTAL contract, exclusiv TVA		**14,097,534.62**	**23,137.02**	**61,309.98**	**675,897.24**	**- 170,122.71**	**14,687,756.15**
			0.16%	0.44%	4.80%	-1.21%	104.19%

Beneficiar
Comuna Grosi


Diriginte santier

Executant

ROMANIA-M.D.R.T.-I.S.C.
COSTIN DUMITRU IOAN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00023522/ 00023522
DOMENII/SUBDOMENII:
1 ; 2.3; 3.1; 5.4; 6; 7

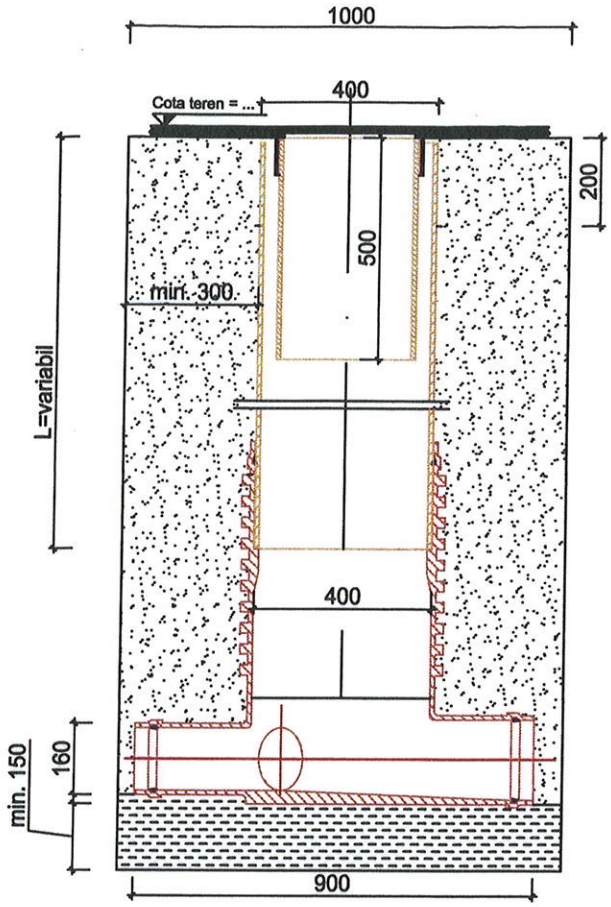


CAPAC DIN FONTA DUCTILA CAMIN RACORD CANALIZARE CLASA B125




Sectiune B-B
1:5





Vedere in plan
1:5

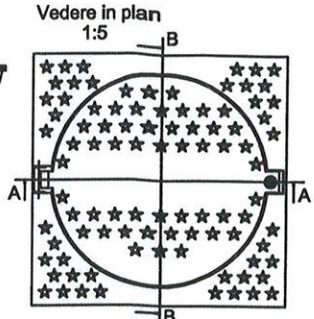

Sectiune A-A
1:5





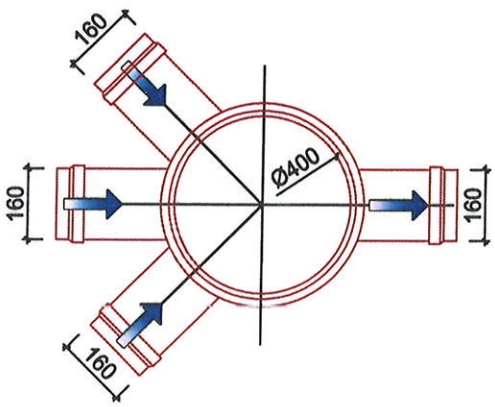

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexă la autorizația de CONSTRUIRE / DESFIINȚARE
Nr. 36 02 - 08 23 din 20
Nota: Dimensiunile sunt exprimate in mm
ARHITECT ȘEF

Nr. crt.	Denumirea	Buc.	Material	Dim.gabarit
1	Baza camin D400	1	PVC	860x500
2	Coloana camin D400	1	PVC	Ø400xL
3	Coloana inaltare D400/315	1	PVC	Ø400x430xØ315

NOTA :

Clase si categorii de importanta

- In conformitate cu STAS 4273-83 Constructii hidrotehnice, Clasa de importanta IV, Categoria constructiei: 4 pentru canalizare si Categoria constructiei: 3 pentru apa
- In conformitate cu Cod proiectare seismica P100-1-2013, Partea I Cladiri, Clasa de importanta : III
- In conformitate cu HG 766/1997, Categoria de importanta: "C- normala"
- In conformitate cu HG 925/1995, Exigentele de performanta sunt: Is

CALIGARU C. DAN ... INGINER VERIFICATOR PROIECTE A; B; C; D; E; F

SOCIETATEA COMERCIALA XALLO TEHNIC S.R.L. CUI 32069301 J24/642/2013 BAIA MARE - MARAMURES

Verificator/ expert	Prenume/Nume	Semnatura	Referat/expertiza nr./Data

Proiectant
S.C. XALLO TEHNIC S.R.L.
Str. Victor Babes nr. 15/4, Baia Mare, Maramures

"INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA GROSI, COMUNA GROSI, JUDETUL MARAMURES"

Pr. nr. XT 139 2021

Specificatie	Nume	Semnatura
Resp. proiect	ing. Daniel Dorofteese	
Proiectat	ing. Daniel Dorofteese	
Desenat	ing. David Hepea	


Scara: %

Data: Octombrie 2021


Detaliu tip camin racord fara placa beton


Faza: PT
Plansa D-11
Rev. 0

Beneficiar: COMUNA GROSI

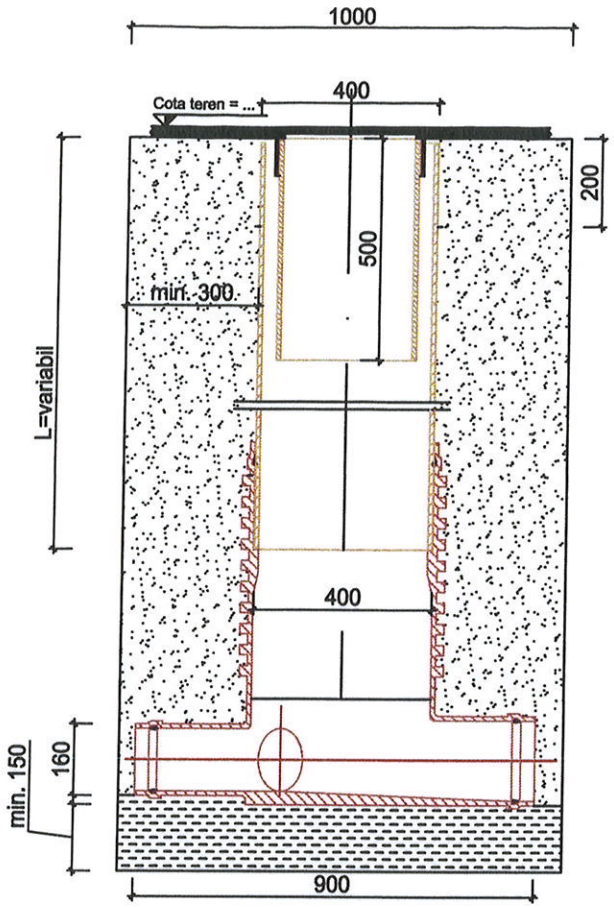

CAPAC DIN FONTA DUCTILA CAMIN RACORD CANALIZARE CLASA B125

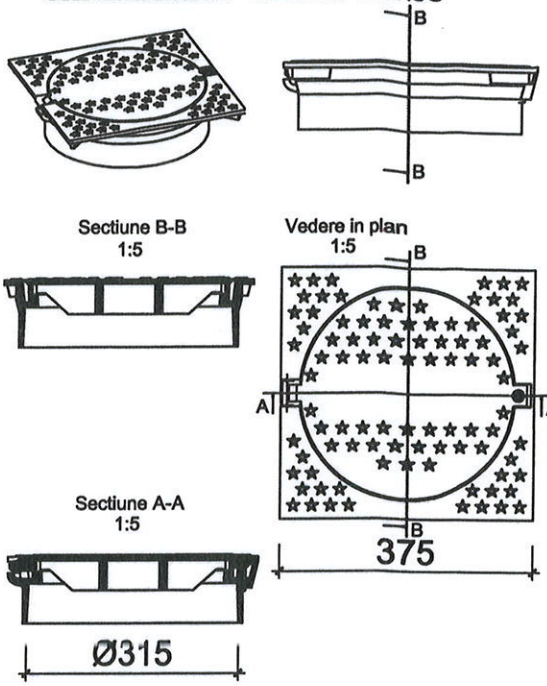

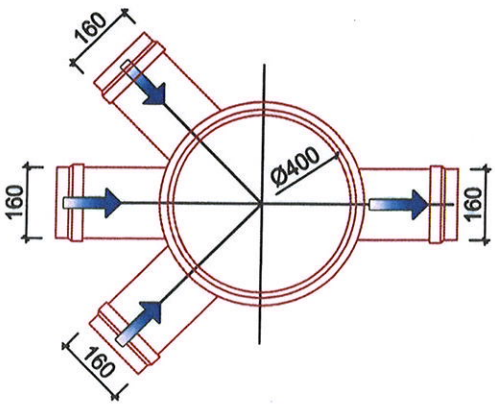

CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREŞ
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizatia de CONSTRUIRE
36 02 -08 23
Nr. _____ din _____ 20__
ARHITECT ŞEF

Notă: Dimensiunile sunt exprimate în mm
X1 = Ø160

Nr. crt.	Denumirea	Buc	Material	Dim.gabarit
1	Baza camin D400	1	PVC	860x500
2	Coloana camin D400	1	PVC	Ø400xL
3	Coloana inaltare D400/315	1	PVC	Ø400x430xØ315

NOTA :

Clase si categorii de importanta
- In conformitate cu STAS 4273-83 Constructii hidrotehnice, Clasa de importanta IV, Categoria construcției: 4 pentru canalizare si Categoria construcției: 3 pentru apa
- In conformitate cu Cod proiectare seismica P100-1-2013,Partea I Cladiri, Clasa de importanta : III
- In conformitate cu HG 766/1997, Categoria de importanta: "C- normala"
- In conformitate cu HG 925/1995, Exigentele de performanta sunt: Is

CĂLUGĂRU C. DAN
ROMÂNIA
NR. 0584
A; B; C; D; E
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA COMERCIALĂ
CUI 32069301
XALLO TEHNIC
S.R.L.
J24/642/2013
BAIA MARE - MARAMUREŞ

Verificator/ expert	Prenume/Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza nr./Data

Proiectant S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. Str. Victor Babes nr. 15/4, Baia Mare, Maramures	**"INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA GROSI, COMUNA GROSI, JUDETUL MARAMURES"**	Pr. nr. XT 139/2021

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	*Detaliu tip camin racord fara placa beton*	Faza: PT
Resp. proiect	ing. Daniel Dorofteese				Plansa D-11
Proiectat	ing. Daniel Dorofteese		Data: Octombrie 2021		
Desenat	ing. David Hepea			Beneficiar: COMUNA GROSI	Rev. 0

Obiectiv: **Infiintare retea de canalizare in localitatea Grosi, comuna Grosi, jud. Maramures**

Obiect: .....

NOTA DE SANTIER NR. 7 / 03.11.2025

Incheiata azi 03.11.2025 , la solicitarea executantului , fiind de fata:

- Din partea executantului: .....Costin Robas Alexandru.....
- Din partea proiectantului: .....Dorofteese Daniel.....
- Din parte beneficiarului: .....Costin Dumitru.....


S-au luat la cunostinta urmatoarele probleme aparute in timpul executiei lucrarilor :

1.Avand in vedere ca de la data intocmirii PT pana la executia lucrarilor s-au inregistrat imobile noi care necesita racordare la utilitati, se va suplimenta numarul de racorduri cu 42 buc.

2.In locurile in care terenul nu este drept si nu permite incasatrarea capacului de fonta in placa de beton conform proiect, se va monta doar capacul de fonta agrementat de producator.





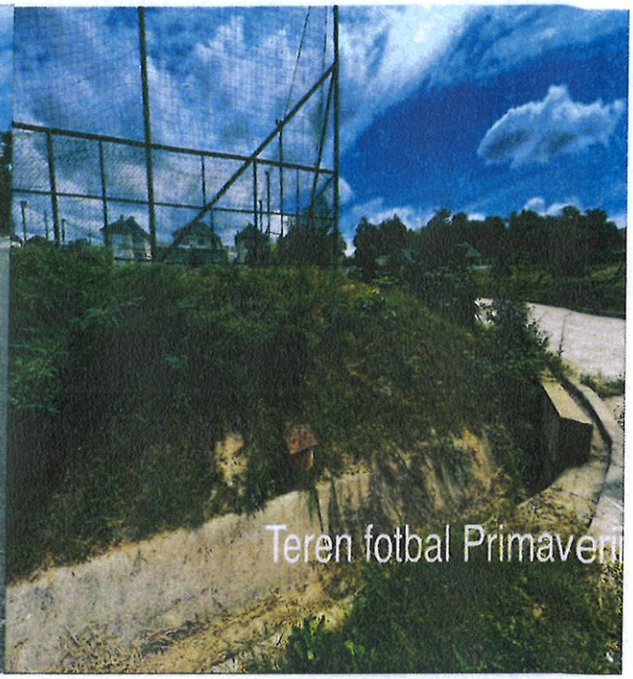

Numele si prenumele	Functia in proiect	Semnatura
Dorofteese Daniel	Proiectant	
Costin Robas Alexandru	Sef de santier	
Costin Dumitru	Diriginte de santier	

SOPOIAN G. CORNEL
ROMÂNIA
I.S.C.
0000102
9.1
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA

SOCIETATEA COMERCIALA
CUI 32066301
3
EXALEO TEHNIC
S.R.L.
24/642/2015
BAIA MARE

ROMANIA-M.D.R.T.-I.S.C.
COSTIN DUMITRU-IOAN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 0002010[illegible]: 00023522
DOMENII/SUBDOMENII:
1; 2.3; 3.1; 5.4; 6; 7
